

令和3年8月5日

一般財団法人クリーンいわて事業団

公共関与型産業廃棄物最終処分場整備事業に係る 土木施設建設工事の進捗状況のお知らせ

八幡平市平館における標記施設の整備につきましては、平素より特段の御理解、御協力をいただき、厚く御礼申し上げます。建設工事の進捗について、以下のとおり御報告します。

1. 工事計画

(1) 工事工程

2021年(令和3年)	8月	9月	10月	備考
準備工 伐採工	■			大型車両通行 あり
仮設工 仮設沈砂池(上流側) 水路切替工(椀沢水路)	■			
椀沢水路の構造物(U字側溝)撤去工 椀沢(分水路) 椀沢(本線)	■		■	
地盤改良工	■			大型車両資材 搬入

- ・建設工事現場は、お盆休みのため、8/7(土)から8/15(日)まで休工となります。
なお、休工期間中は、建設工事現場の安全確認のため、1回/日の現場巡視を行います。
- ・8月より地盤改良や伐採作業が本格的に始まり、大型車両の通行が多くなる予定です。
現場出入口には、交通誘導員を配置し、事故防止に努めますが、お近くを通行する際には、御不便をお掛けする場合がございますので、何卒御理解を賜りますようお願い申し上げます。

お問い合わせ先

【発注者】


一般財団法人 クリーンいわて事業団八幡平駐在 (TEL:0195-78-8872)

【受注者】

大成建設(株)・(株)平野組・大森工業(株)特定共同企業体

公共関与型最終処分場土木施設建設工事作業所(TEL:0195-78-8212)

(2) 工事箇所

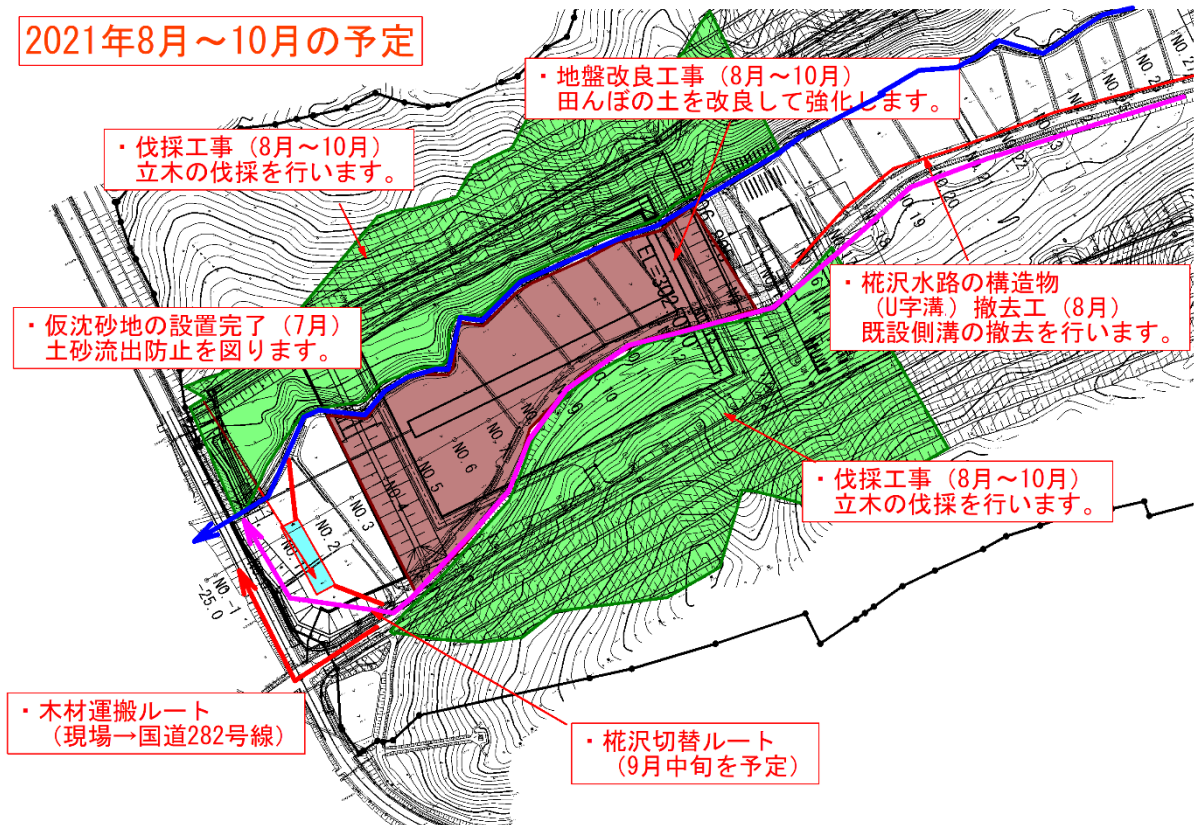

2. 進捗状況

(1) 樫沢水路構造物(U字側溝)の撤去を行いました。(6月下旬)



U字側溝撤去状況



U字側溝撤出状況

(2) 地盤改良工事箇所の草刈りを行いました。(6月下旬)



草刈り状況



集草状況



一般廃棄物として搬出

(3)大型車両用の進入路を作りました。(7月中旬)



碎石敷均し状況



鉄板敷設状況



進入路完了

(4)最下流側に仮沈砂地が完成しました。(7月下旬)



仮沈砂地造成状況



仮沈砂地シート敷設状況



仮沈砂地設置完了
