

地域にお住まいの皆様へ

一般財団法人クリーンいわて事業団

**公共関与型産業廃棄物最終処分場整備事業に係る  
土木施設・浸出水処理施設建設工事の進捗状況のお知らせ**

八幡平市平舘における標記施設の整備につきましては、平素より特段の御理解、御協力をいただき、厚く御礼申し上げます。建設工事の進捗等について、以下のとおり御報告します。

**1 処分場整備事業場内の工事工程（裏面の図を御覧ください。）**

施 工 内 容	令和7年			
	3月	4月	5月	
土 木 施 設	敷地造成工（掘削工、盛土工）	除雪工・準備工 ■■■■■		継続施工
	雨水排水設備工（側溝工等）			継続施工
	防災調整池工（擁壁埋戻し等）	除雪工・準備工 ■■■		継続施工
	植生工（植生マット工）			継続施工
	建築工事（管理棟他）	準備工 ■■■■■■■■■■■■■■■		継続施工
浸 出 水	調整槽工事	準備工	着工	継続施工
	処理棟工事	準備工	着工	継続施工

- ・敷地造成工：重機の走路等を除雪・整備し、4月から土仕事を再開します。
- ・雨水排水設備工：冬期間から継続して、排水側溝を設置しています。
- ・防災調整池工：4月から擁壁（防災調整池の壁）の埋戻しを再開します。
- ・植生工：4月から法面保護のための植生マットの張り付けを再開します。
- ・建築工事：3月下旬から管理棟等の工事準備を開始します。
- ・大型重機等搬入：土工事の再開に伴い、4月上旬から大型車両の通行が多くなります。出入口に交通誘導員を配置し、搬出経路等の安全通行に努めてまいります。地域の皆様の御理解と御協力をお願い申し上げます。
- ・調整槽工事：3月下旬から工事準備に取りかかり、その後、掘削などに着手します。
- ・処理棟工事：3月下旬から工事準備に取りかかり、その後、掘削などに着手します。


**【発注者】**

一般財団法人クリーンいわて事業団八幡平駐在（TEL：0195-78-8872）

**【受注者】**

- ・土木施設建設工事：大成建設(株)・(株)平野組・大森工業(株)特定共同企業体  
公共関与型最終処分場土木施設建設工事作業所（TEL：0195-78-8212）
- ・浸出水処理施設建設工事：水ingエンジニアリング(株)（現場事務所準備中）

## 2 工事箇所図

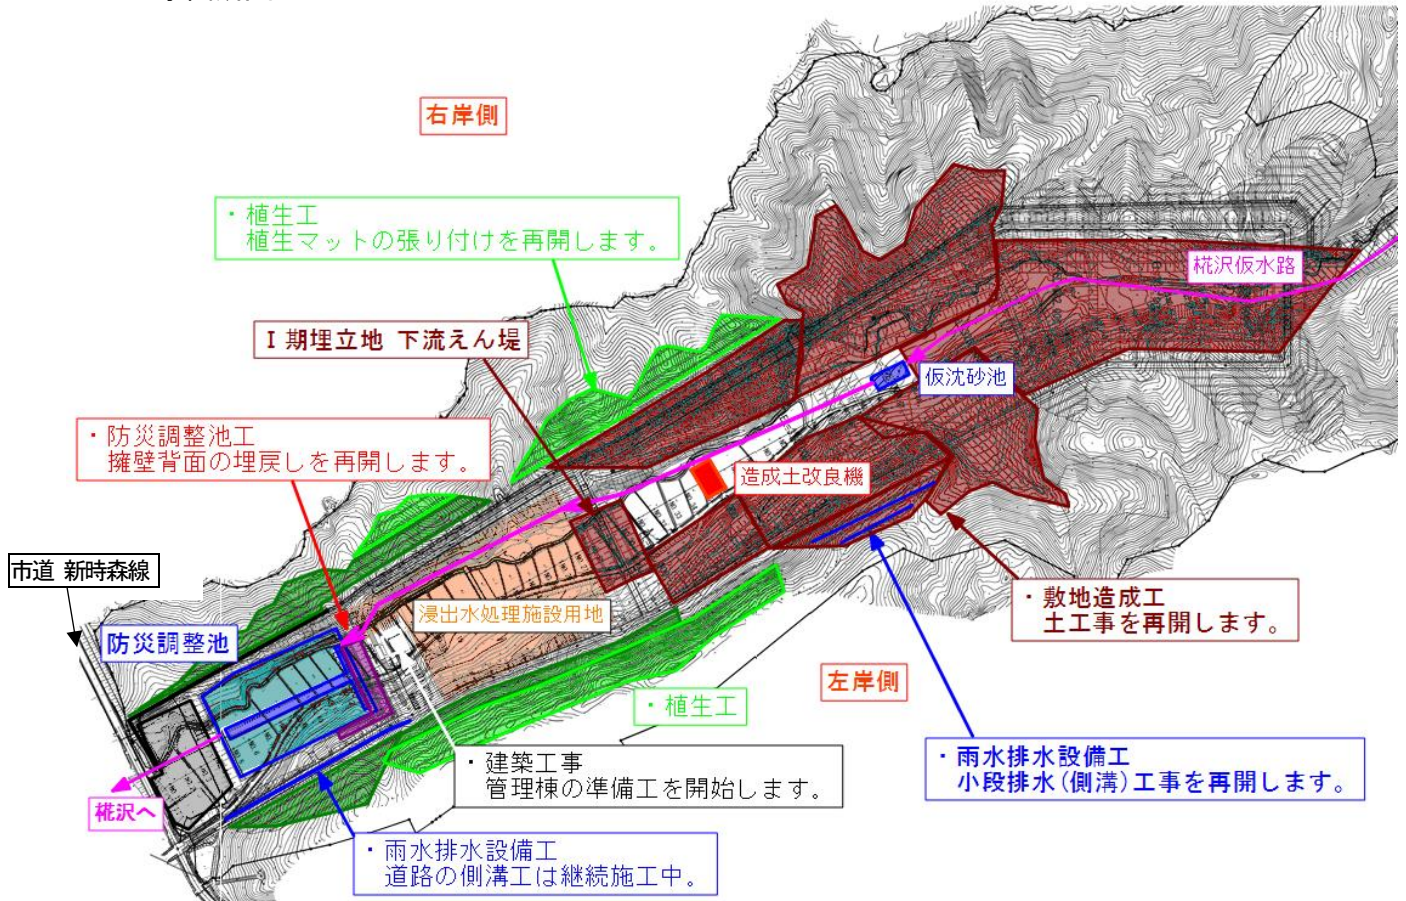

栴沢の水は、工事現場内の仮水路からそのまま栴沢に流れています。  
※本工事では、栴沢の水は使用していません。

## 3 工事進捗状況（1月～3月） 除排雪作業と側溝工事



積雪状況（場内）



積雪状況（防災調整池）



側溝の基礎コンクリート打設



除雪状況（造成土改良機用地）



排雪状況（防災調整池）



落蓋式側溝の布設作業
