

**公共関与型産業廃棄物最終処分場整備事業に係る
土木施設建設工事の進捗状況のお知らせ**

八幡平市平館における標記施設の整備につきましては、平素より特段の御理解、御協力をいただき、厚く御礼申し上げます。建設工事の進捗等について、以下のとおり御報告します。

1.工事工程

2022年(令和4年)	8月	9月	10月	備考
準備工 伐採工	[進捗バー]			大型車両通行あり
防災調整池工 擁壁工		[進捗バー]		大型車両資材搬入
付替河川工 側溝工、集水柵工	[進捗バー]			水路流末より上流側へ施工
地盤改良工 固結工	[進捗バー]			大型車両資材搬入
敷地造成工 掘削工、盛土工	[進捗バー]			防災調整池部 浸出水処理施設部 Ⅱ期埋立予定地
雨水バイパス管工 管設置工	[進捗バー]			

お盆休み

- ・工事区域全体の伐採や造成を開始しています。下流側には各所、仮沈砂池を設置して、土砂流出防止に努めています。
- ・資機材搬出入のための大型車両の通行が多くなっています。現場出入口には、交通誘導員を配置し、事故防止に努めますが、お近くを通行する際には、御不便をお掛けする場合がございますので、何卒御理解を賜りますようお願い申し上げます。

お問い合わせ先

【発注者】


一般財団法人 クリーンいわて事業団八幡平駐在 (TEL: 0 1 9 5 - 7 8 - 8 8 7 2)

【受注者】

大成建設(株)・(株)平野組・大森工業(株)特定共同企業体

公共関与型最終処分場土木施設建設工事作業所(TEL: 0 1 9 5 - 7 8 - 8 2 1 2)

2 工事箇所

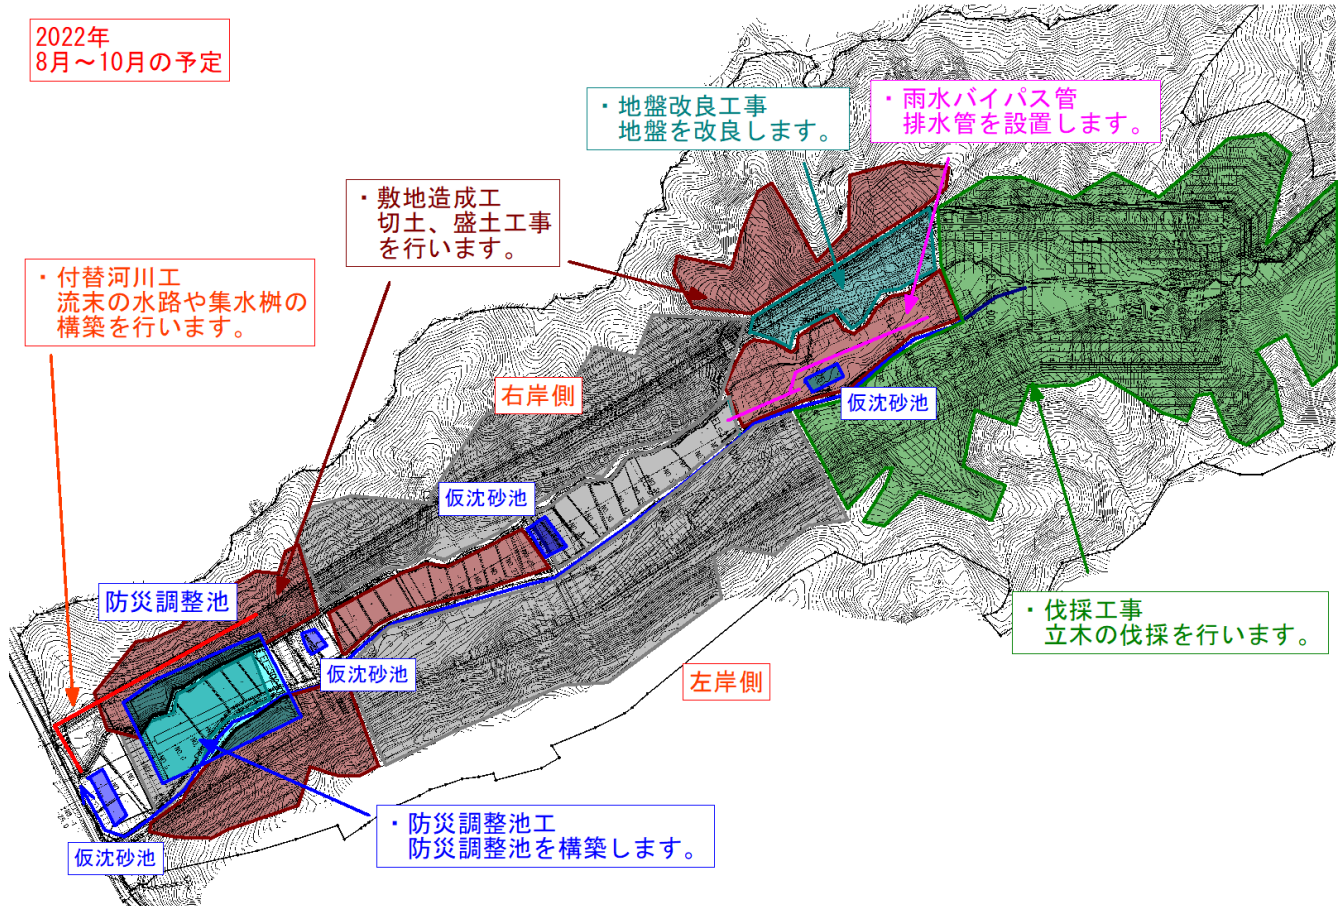

3 進捗状況(7月～8月)

(1) 防災施設工の構築を行いました。



下流側全景



防災調整池工(施工中)



仮沈砂池設置完了

(2) 地盤改良工事及び法面工を行いました。



地盤改良状況(施工中)



法面の植生基材吹付け状況
(施工中)



法面の小段排水設置状況
(施工中)
